

GOBIERNO REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDUM Nº 395- 2024-ME/DREP-DUGELEC/D.

DE LA : Dra. Norka Belinda, CCORI TORO

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

PARA : ING. RENAN MAMANI ARPASI.

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA.

ASUNTO: PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

REFERENCIA: Oficio No 182-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU.

FECHA : El Collao-llave, 10 de diciembre del 2024.

Mediante el presente, para su conocimiento hago alcance el oficio indicado en la referencia, en el cual, remite el informe Nº000214-2024-JCIA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU, sobre LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA, realizada a la INTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL No 1062-CHUNTACOLLO, por tanto, debe evaluar la disponibilidad de módulos que deben ser destinados a lo requerimientos solicitados, tenga presente.

Bajo responsabilidad funcional.

Atentamente,



Jr. Sucre N° 215 - Ilavi

Firmado digitalmente por: ZEVALLOS ALVAREZ Jose FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04/12/2024 19:31:11-0500

Lima, 04 de diciembre del 2024

OFICIO N° 000182-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

Señora Norka Belinda Ccori Toro **DIRECTORA** UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DEL COLLAO Presente. -

PARA CONOCIMIENTO SOBRE MÓDULOS DISPONIBLES EN LA INSTITUCIÓN Asunto

EDUCATIVA INICIAL Nº 1062 CON CÓDIGO DE LOCAL Nº 675295, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO CHUNTACOLLO, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL

COLLAO, REGIÓN PUNO.

a) INFORME N° 000214-2024-JCIA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU Referencia

b) OFICIO Nº 035-2024-DREP-UECI-IEI N 1062-I

E-019927-2024- V-1 Expediente

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia b), para indicar que, en virtud de lo solicitado, se ha realizado la verificación de estado de módulos prefabricados en la I.E.I. Nº 1062 con código de local Nº 675295, ubicado en el centro poblado Chuntacollo, distrito Ilave, provincia El Collao, región Puno.

Al respecto, se remite el informe a) de la referencia, mediante el cual se da cuenta de los resultados de la inspección técnica, poniendo de conocimiento, para que realice las gestiones que le correspondan.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Firmado digitalmente JOSE ZEVALLOS ALVAREZ

Jefe (e) de la Unidad Zonal Puno-Tacna Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación

(JZA/phcm)

cc:

PAUL HUGO CANO MACHICAO - Locador de Servicio





Jr. Carabava N.º 341

Cercado de Lima, Lima01



Firmado digitalmente por: INGALUQUE ARAPA Juan Carlos FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 23/10/2024 16:24:10-0500

Lima, 23 de octubre del 2024

INFORME N° 000214-2024-JCIA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

A : SUSY PALOMINO ALAVE

Jefe Zonal Puno

De : JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA

Monitor de Campo

Asunto : VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE KITS DE INFRAESTRUCTURA

(MÓDULOS EDUCATIVOS, KITS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, KIT DE PARARRAYOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) INSTALADOS EN LA IEI № 1062, UBICADO EN EL C.P. CHUNTACOLLO, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -

REGIÓN PUNO.

Referencia: PROVEIDO Nº 000945-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

Expediente : E-019927-2024

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con el propósito de informar lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES:

- 1.1. Mediante OFICIO N° 035-2024-DREP-UECI-IEI N 1062-I de fecha 13 de agosto de 2024 la Directora de la IEI 1062 presenta al PRONIED documento con el asunto: "Comunico disponibilidad de Módulos Prefabricados instalados por PRONIED. Por próximo inicio de obra en IE 1062, distrito llave, provincia El Collao".
- 1.2. Mediante PROVEIDO N° 000769-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU de fecha 03 de setiembre de 2024 se solicita a la Monitora de Campo Arq. Adry Baion Aruhuanca "REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE MODULO E INCLUIR PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA REASIGNACIÓN A FIN DE REMITIR INFORME TECNICO A UGME Y UGEL"
- 1.3. Mediante PROVEIDO N° 000002-2024-ARBA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU de fecha 11/10/2024 la Arq. Adry Bailon presenta el proveído con la indicación "PREVIA CORDINACION CON JEFATURA ZONAL, SE INDICA QUE NO SE REALIZO LA INSPECCION A LA IE, DEBIDO A LA PROGRAMACIÓN; POR LO QUE SE RECOMIENDA PROGRAMAR LA VERIFICACION EN EL PRESENTE MES DE OCTUBRE"
- 1.4. Mediante PROVEIDO N° 000945-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU de fecha 18/10/2024 se me solicita "EN ATENCIÓN AL PEDIDO DE ORIGEN, DEBERÁ REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE MODULO E INCLUIR PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA REASIGNACIÓN A FIN DE REMITIR INFORME TECNICO A UGME Y UGEL REALIZAR LA INSPECCION EN MES OCTUBRE CON CARACTER DE PRIORIDAD"

II.- ACCIONES REALIZADAS:

2.1 Se ha coordinado previamente con la directora de la Institución Educativa, realizado la visita en fecha 21/10/2024, la misma que se efectuó de forma conjunta con la directora de la Institución Educativa.





Jr. Carabaya N.° 341

Cercado de Lima, Lima01 Central: (01) 680 6777



2.2 Durante la inspección se verificó el estado actual de Módulos Educativos que corresponden al Proceso de adquisición Licitación Pública N° 15-2021-MINEDU/UE 108-1, que consiste en kit de infraestructura (02 módulos educativos, kits complementarios de instalaciones sanitarias, kit de pararrayos, Mobiliario y Equipamiento).

De la evaluación se ha verificado que los kit de infraestructura se encuentran en BUEN ESTADO, el detalle de la evaluación se describe en las respectivas fichas de inspección de estado de módulos educativos de cada aula y ficha de inspección de estado de kit de pararrayos que se adjuntan al presente informe.

2.3 Es urgente la reasignación y reubicación de éstos MPFs considerando que la IEI 1062 será beneficiada con la ejecución de un proyecto de inversión pública, CUI 2571641 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO -DEPARTAMENTO DE PUNO, que de la consulta realizada en el portal del SSI registra que: [21/10/2024] al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 el proyecto de encuentra CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL Nº 06202-2024-MPCI/GM. en fecha 25 de julio del 2024. ESTA EN PROCESO DE LICITACION PARA SU EJECUCION.

En reunión con el Gerente de infraestructura de la Municipalidad Provincial de El Collao, informa que efectivamente se encuentran en proceso de contratación para la ejecución y supervisión de la obra y se tiene programado la buena pro de la ejecución de obra para el 22/10/2024 y para la supervisión el 18/10/2024 ya se otorgó la buena pro; se tiene como fecha estimada para el inicio de obra en el mes de diciembre de 2024, por lo que es necesario y urgente poder reasignar los Módulos Educativos.

III.- CONCLUSIONES

 3.1. De la inspección ocular efectuada, se concluye que el kit de infraestructura (02 módulos educativos, kits complementarios de instalaciones sanitarias, kit de pararrayos, Mobiliario y Equipamiento) se encuentra en BUEN ESTADO.

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA							ATE	NCION		
INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO DE LOCAL	CODIGO MODULAR	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CANTIDAD MPF AULA	CANTIDAD KIT PRYO	RESULTADO	
IEI 1062	675295	1609692	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	CHUNTACOLLO	02	01	Kit de infraestructura (02 módulos educativos, kits complementarios de instalaciones sanitarias, kit de pararrayos, Mobiliario y Equipamiento) se encuentra en BUEN ESTADO	

3.2. Se ha suscrito las respectivas fichas de inspección del estado del módulos educativos y kit de pararrayo.

Se Adjunta:

- Registro fotográfico
- Ficha de inspección de estado de módulos prefabricados
- Ficha de inspección de estado del kit de pararrayo

IV.- RECOMENDACIONES


4.1. Se recomienda derivar la presente a la UGEL EL COLLAO, para que pueda tomar acciones para su reasignación, pues son ellos quienes pueden disponer de los referidos bienes de acuerdo a las atribuciones de propiedad que le competen.





Cercado de Lima, Lima01 Central: (01) 680 6777







- 4.2. Se recomienda a la UGEL EL COLLAO coordinar con la Municipalidad Provincial de El Collao sobre las consideraciones que se tienen en el Expediente Técnico respecto a los Módulos Educativos en el Proyecto de inversión Pública, los costos de desmontaje, traslado e instalación de éstos en una nueva Institución Educativa, así como las fechas probables de inicio de obra.
- 4.3. Se recomienda que la reasignación de estos módulos educativos sea a otra Institución Educativa de la misma jurisdicción, que se encuentra cerca y que tenga necesidad de atención con módulos educativos.

PANEL FOTOGRAFICO:



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Se observa la presencia del monitor de campo en la Institución Educativa Inicial 1062.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Vista exterior de los 02 Módulos Educativos, las misma que se encuentran en Uso y en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.








Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho







Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Vista interior de los Servicios Higiénicos, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Se observa las cajas de los pozos a tierra desnivelados y hundidos.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Se observa las cajas de los pozos a tierra desnivelados y hundidos.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Se observa señalización y tablero eléctrico en buen estado.









Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Se observa señalización y extintor, se encuentra en buen estado.



Fecha: 21 de octubre de 2024 Descripción: Vista interior del Módulo Educativo, se encuentra en buen estado.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Firmado digitalmente JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA MONITOR DE CAMPO Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación

(JCIA)

CC:





Cercado de Lima, Lima01 Central: (01) 680 6777



Viceministerio de Gestión Institucional

FICHA DE INSPECCIÓN DE ESTADO DE MÓDULOS EDUCATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	Nombre de la II.EE Código Modular Código Local	: :	1609692 675295
UBICACIÓN	:	Región Provincia Distrito CCPP / AAHḤ	:	PUNO EL COLLAD LAVE CHUNTACOLLO
FECHA	:	21/10/2024		
el local de la I.E		NILCA POROS 106 Z NGALUQUE DE NEDU, a fin de llevar ción.	a ca	del año 2024, se reunieron en de una parte (DNI N° 034 (19)), y de otra parte el (DNI N° 4093 (88)) en bo la inspección de los módulos educativos
Habiendo realizado la inspe Nº1; se constató que tiene Nº2, Nº3 y Nº4	cciór n el :	n de estado de siguiente estado, de a	Mó acue	dulo(s) Educativo(s), descritos en el Cuadro rdo a los detalles indicados en los Cuadros
CUADRO №1 Descripción y Cantidad de	Aula	s Prefabricadas por II	.EE.	

COADIO N-1				
Descripción	y Cantidad	de Aulas	Prefabricadas	por II.EE.

MÓDULO	#	CONFORME
MODULO EQUESTIVO DE SULS INICIAL	0]	
MODULO EDUCATIVO DE GULA INICIAL	DZ	

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA CAP. 008533 Monitor de Carippo Unidad Zonal Puno-Tacna Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación






CONTRATO: 48-2022 MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO Nº2

Croquis de Ubicación de los Módulos Educativos

A efectos de dar inicio al proceso de inspección, se procede a realizar el siguiente croquis referente a la ubicación de los módulos prefabricados.

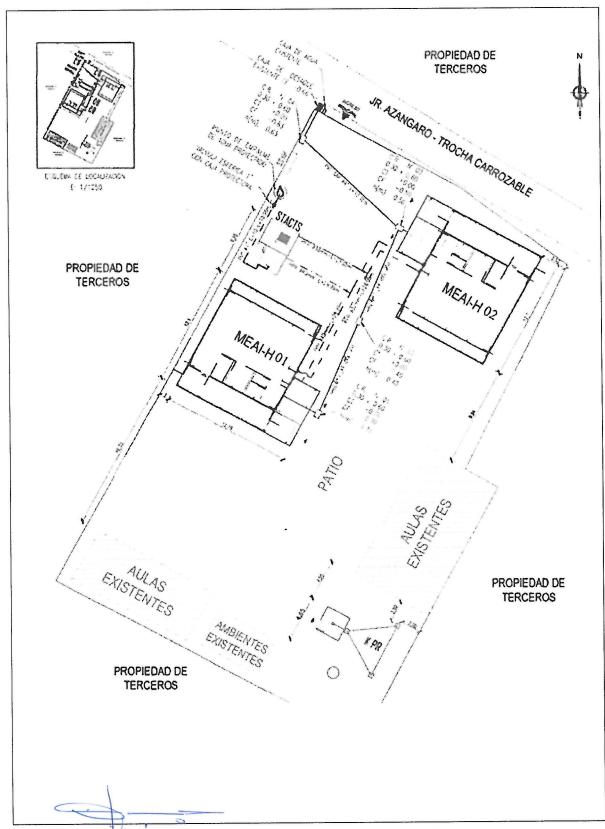

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA CAP. 008533 Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación



INSTITUCION EDUCATIVA: LE 1062 CONTRATO: 48-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO Nº3

Estado de Inspección de cada Módulo Educativo

Colocar check en el recuadro "Estado" para dar la conformidad

Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

COMPONENTES DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO Nº

#	TIPO DE COMPONENTE DE CADA MÓDULO PREFABRICADO	ESTADO
1	TERRENO	
2	APOYOS DE CONCRETO	
3	RAMPAS/ESCALERAS	BUEN ESTADO
4	PLATAFORMA .	_
5	COLUMNAS	BUEN ESTADO
6	VIGAS/VIGUETAS/CORREAS	BUEN ESTADO
7	ARRIOSTRES/TEMPLADORES	BUEN ESTADO
8	COBERTURA	LA PIRECTORA INFORMA QUE HAY FILTRACIONES.
9	CANALETAS Y CUMBRERAS	REGULAR
10	MUROS	REGULAR ESTADO
11	VENTANAS	BUEN ESTADO
12	PUERTAS	BUEN ESTADO
13	CERRAJERÍA	OPERATIVO
14	PISO	BUEN ESTADO
15	BARANDAS	
16	LUMINARIAS	O PERST WOS
17	TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	DPERST 1003
18	TABLERO ELÉCTRICO	SUEN ESTADO
19	CAJA DE PASO	BUEN ESTADO.
20	SEÑALÉTICA	BUEN ESTADO
21	POZO A TIERRA	DESNIVELADO

INSTITUCION EDUCATIVA: 151 1067 CONTRATO: 48-7072 MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO Nº4

Conformidad de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

Colocar check en el recuadro para dar la conformidad Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

	CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEL MÓDULO N° 🔼					
#	PROCESO	ESTADO				
1	SE VERIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO	SI, UPERATIVO				

Al término de la diligencia, siendo las. horas del mismo día, se da por finalizada la inspección con la conformidad e indicaciones detalladas en el cuadro N° 3

POR LA INSTITUCIPON EDUCATIVA

POR EL PRONIED

DIRECCIÓN S

Yeni Vilma Quilca Ramos
DIRECTORA (el

NOMBRE Y APELLIDO

YENI UILHA QUILCA BAMOS

DNI N°

NOMBRE Y APELLIDO

JUAN CARLES INGALUQUE ARDPA

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA CAP. 008533 Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerao de Educación

DNINº H0197188

INSTITUCION EDUCATIVA: 15/1067 CONTRATO: 48-2022 MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO Nº3

Estado de Inspección de cada Módulo Educativo

Colocar check en el recuadro "Estado" para dar la conformidad

Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

COMPONENTES DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO Nº 22

#	TIPO DE COMPONENTE DE CADA MÓDULO PREFABRICADO	ESTADO				
1	TERRENO					
2	APOYOS DE CONCRETO					
3	RAMPAS/ESCALERAS	BUEN ESTADO				
4	PLATAFORMA					
5	COLUMNAS	BUEN ESTADO				
6	VIGAS/VIGUETAS/CORREAS	BUFN ESTADO				
7	ARRIOSTRES/TEMPLADORES	BUEN ESTADO				
8	COBERTURA	LA PIRECTORS INFORMS QUE HAY FILTESCIONES				
9	CANALETAS Y CUMBRERAS	REGULAR ESTADO				
10	MUROS	REGULAR ESTADO				
11	VENTANAS	BUEN ESTO DO				
12	PUERTAS	BUEN ESTODO				
13	CERRAJERÍA	OPERATIVO				
14	PISO	BUEN ESTADO				
15	BARANDAS					
16	LUMINARIAS	OPERATIVOS				
17	TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	OPERATIVOS				
18	TABLERO ELÉCTRICO	BUEN ESTADO				
19	CAJA DE PASO	BUEN ESTADO				
20	SEÑALÉTICA	BUEN ESTADO				
21	POZO A TIERRA	DESNIUELADO.				

INSTITUCION EDUCATIVA: _ E 1062 CONTRATO: 48-2027 MINEDU/VMGI-PRONIED

CUADRO Nº4

Conformidad de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

Colocar check en el recuadro para dar la conformidad Imprimir 1 hoja por cada módulo instalado

CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEL MÓDULO Nº 🔼 🔾					
#	PROCESO	ESTADO			
1	SE VERIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO	OPERSTIVO			

con la conformidad e indicaciones detalladas en el cuadro N° 3

POR LA INSTITUCIPON EDUCATIVA

POR EL PRONIED

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA CAP. 008533 Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación

NOMBRE Y APELLIDO

JUAN CARLOS INFALLIQUE ADAPA

DNINº 401971 88

NOMBRE Y APELLIDO Yeni Vilma Quilca Ramos.

DNI N°

FICHA DE INSPECCION DE ESTADO DE KIT DE PARARRAYOS

		I.E. J				
PUND 1	EL	COLLAD	/	LAVE	/	CHURTACOLLI
	(regio	ón / provincia / c	distrito	/ centro poblad	do)	
					1	

PROCESO : LP Nº 15 - 2021 - HINEOU / DE 108 - 1

CONTRATO : H8 - 2022 - MINEOU / VMGI - PRONIEO.

CONTRATO : 48-2022-MINEDU/VM61-PRONIED.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 1E1. 106.Z.

FECHA : 21/10/2024.

CUADRO Nº3

Verificación de los Componentes de cada Módulo Prefabricado y/o Kit de Infraestructura de acuerdo al avance encontrado a la fecha. La inspección, se hará en acorde a las especificaciones técnicas, planos de planta y detalles <u>aprobado en el Manual de Montaje</u>, <u>Desmontaje</u> presentado por el contratista. (Imprimir 1 hoja por cada Módulo Prefabricado)

COMPONENTES	AVANCE	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS
CIMENTACION – BASE PARARRAYOS (NIVELACION Y ACABADO)		BUEN ESTADO
CABEZA DE PARARRAYOS (BUENA FIJACION AL CABLE Y ACCESORIO DE CONEXIÓN)		BUEN ESTADO
CONTADOR DE DESCARGAS (FIJACION FIRME AL MASTIL)		SUEN ESTADO
SECCIONADOR EN CAJA (FIJACION FIRME AL MASTIL)		BUEN ESTADO
MÁSTIL MULTI SECCIÓN 6",4",3" Y 2" (NIVELACION Y VERTICALIDAD DE MASTIL DE 6")		BUEN ESTAPO
CABLE DE COBRE DESNUDO SIN CURVATURAS MENORES A 130° (LO MAS VERTICAL POSIBLE)		BUEN ESTADO
GRAPAS DE POLIAMIDA Y ABRAZADERAS DE FIJACION AL MASTIL		BUFN ESTADO
POZOS DE TIERRA, SOLDADURA Y ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURAS		DESMUELADOS Y HUNDIDOS.
CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN, CIMENTACION DE CERCO, NIVELACION DE PUERTA Y CERCO PERIMETRICO (APERTURA SIN ESFUERZO)		BUEN ESTADO
UBICACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL E IDENTIFICACION DEL FABRICANTE		BUEN ESTADO
CANDADO, LLAVE Y CERROJO		CON PRESENCIA DE OXIOBCION
LIMPIEZA DE BASURA Y/O DESMONTE POST INSTALACION.		

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
CAP. 008533
Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tecnal
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

DIRECCION Yeni Ytima Quilea Ramos
DIRECTORA (e)

#	INDICACIONES GENERALES DEL KIT DE PARARRAYO
1	
2	
3	
4	
5	

Al término de la diligencia, siendo las _______ horas del mismo día, se dio por culminada la visita de inspección

Arq. JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA
CAP. 008533
Monitor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacna
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

INSPECTOR PRONIED

JUAN CARLOS INGALUQUE ARAPA

DNI N° 40197188
