



**“Año del Bicentenario, de la consolidación de  
nuestra Independencia y de la conmemoración de  
las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

Quispe Maquercota, 08 de Agosto del 2024

**OFICIO N° 020-2024/DUGELEC-DIEP.70751-QM**

SEÑORA : DRA. NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

Presente.-

ASUNTO : REPORTE DE FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS ISIE- UGEL EL COLLAO  
REF. : NORMAS VIGENTES DE PREVAED-2024

Es muy grato dirigirme a Ud. para poner de su conocimiento sobre la situación real de nuestra institución educativa a la fecha del reporte, para que se tome las consideraciones que amerite el caso, en la ficha se registra los aspectos tales como se verifica al momento.

Además debo informar sobre el reporte que hizo defensa civil del municipio distrital de Pilcuyo de fecha 13 de febrero del 2024, en el que se evalúa la precariedad de los muros del cerco perimétrico de nuestra institución, la misma que requiere una urgente atención por quien corresponda.

Aprovecho la oportunidad, para expresar las consideraciones de estima Personal, el numero cel. Para coordinar es el 935279233.

Atentamente,



  
Lic. Durán Félix Sogua Contreras  
DIRECTOR

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN:** Social

<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b> <b>PRIMARIA</b>	<b>70751</b>
---	--------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	5
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
<b>RESILIENCIA</b>	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	0
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	2
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>12</b>

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 8 =	2.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>

**DIMENSIÓN:** Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	4
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	4
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	4
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	1
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	4
<b>RESILIENCIA</b>	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	1
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	3
Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	1	
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>39</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	39
Operación # / 12 =	3.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>



  
 Lic. Durán Félix Sagua Contreras  
 Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague sin mantenimiento	0
	Local escolar con acceso a Internet .	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2024	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	1
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2024.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	1
TOTAL SUMA DE VALORES			3

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	1
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

EDUCATIVA PRIMARIA	70751
-----------------------	-------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	3
Operación # / 6 =	0.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Firma y Sello del Director  
DIRECTOR

Dimensión	Valor promedio
Social	2.00
Física	3.25
Económica	0.50
Ambiental	2.00
Suma	7.75

Suma Valor promedio	7.75
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.94

Nivel vulnerabilidad del	BAJO
--------------------------	------

**REPORTE PRELIMINAR N° 003 – 13/02/2024 – COED PILCUYO - 16:00 HORAS**

**DERRUMBE ESTRUCTURA GENERAL-QUISPE MAQUERCOTA-PILCUYO-EL COLLAO-PUNO**

**I. HECHOS:**

FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA	DESCRIPCIÓN
13/02/2024	Aproximadamente a las 07:00 horas, se registró en el centro Quispe Maquercota del distrito de Pilcuyo, el derrumbe de 18 ml del cerco perimétrico de material de adobe del lado Noreste de la IEP N° 70751.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	BARRIO	SINPAD
PUNO	EL COLLAO	PILCUYO	QUISPE MAQUERCOTA	QUISPE MAQUERCOTA	190663



**MAPA DE UBICACIÓN**

DERRUMBE DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IEP 70751



### III. EVALUACION DE DAÑOS:

#### 3.1 Reporte de Daños

Derrumbe de 18 metros lineales del lado Noreste del cerco perimétrico de la IEP 70751 Actualizado al 13 de Febrero de 2024, a las 16:00 horas.

#### 3.2 Información Contextual

- El COED-PILCUYO informa que:
  - ✓ Se produjo el derrumbe de una parte del cerco perimétrico de material de adobe perteneciente a la IEP 70751

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACION REALIZADAS:

#### 4.1 Acciones Programadas y/o Ejecutadas

Actualizado al 13 de Febrero de 2024, a las 16:00 horas.

ENTIDAD EJECUTORA	FECHA		ACCIONES	FUENTE
	Inicio	Fin		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO	13 de Febrero del 2024 10:00 horas	13 de Febrero del 2024 10:30 horas	Se comunicó al COED-PILCUYO por parte del Director del centro educativo para realizar la constatación correspondiente.	Director del Centro Educativo
	13 de Febrero del 2024 10:30 horas	13 de Febrero del 2024 10:45 horas	Coordinación con el grupo de trabajo para posterior verificación.	Reporte de responsable de la oficina de GRD y Defensa Civil-Pilcuyo
	13 de Febrero del 2024 11:00 horas	13 de Febrero del 2024 11:35 horas	Se procedió levantar el acta de constatación de los daños ocasionados y evaluación de riesgos post derrumbe.	Reporte de responsable de la oficina de GRD y Defensa Civil-Pilcuyo




**ANEXO**

1. Panel Fotográfico

**ANEXO 1**


**PANEL FOTOGRAFICO**

13/02/2024

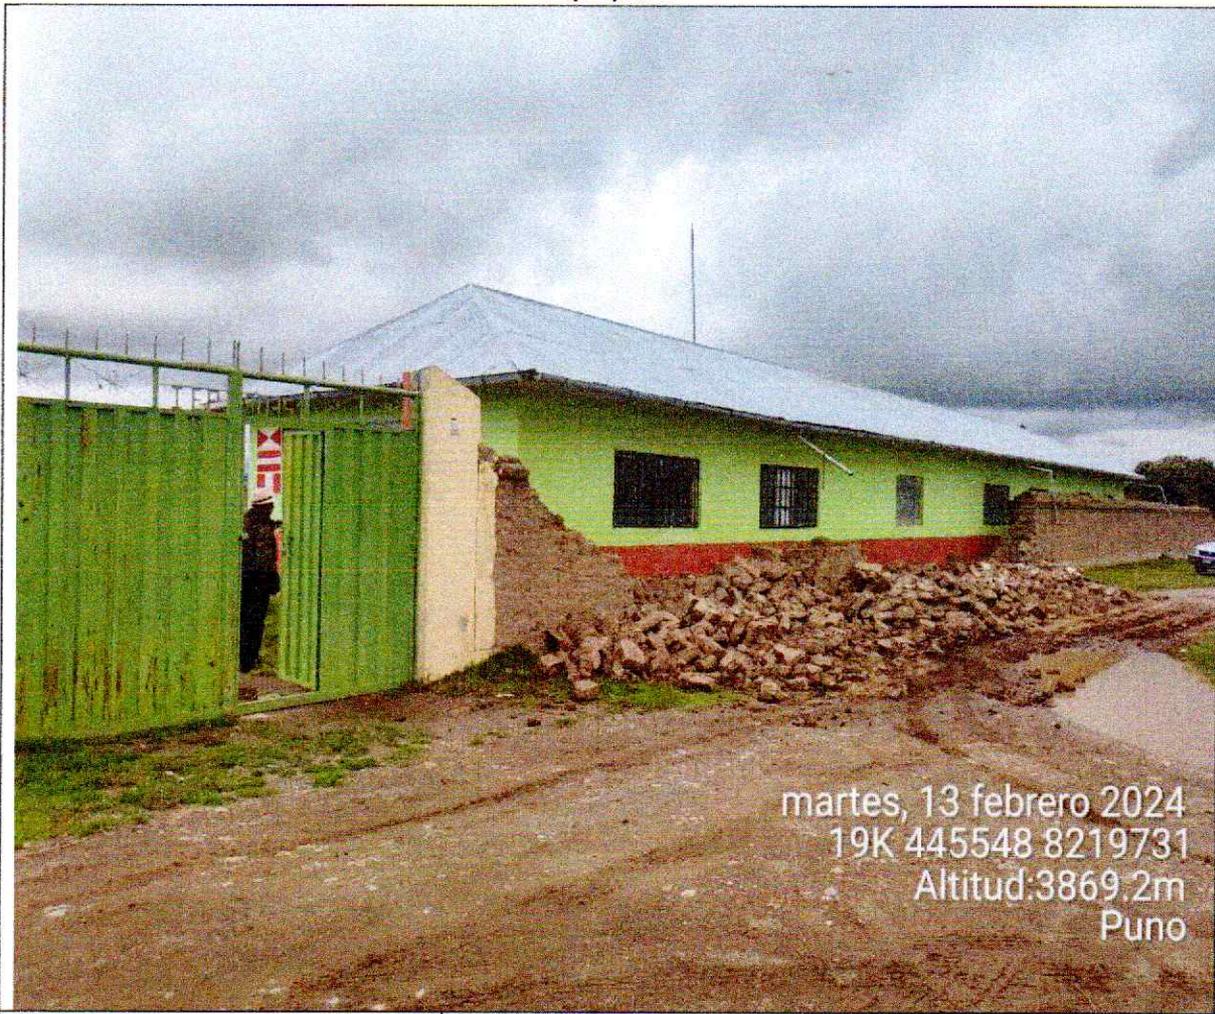

13 de Febrero de 2024

MURO DE 18 ML DEL LADO NORESTE DERRUMBADO

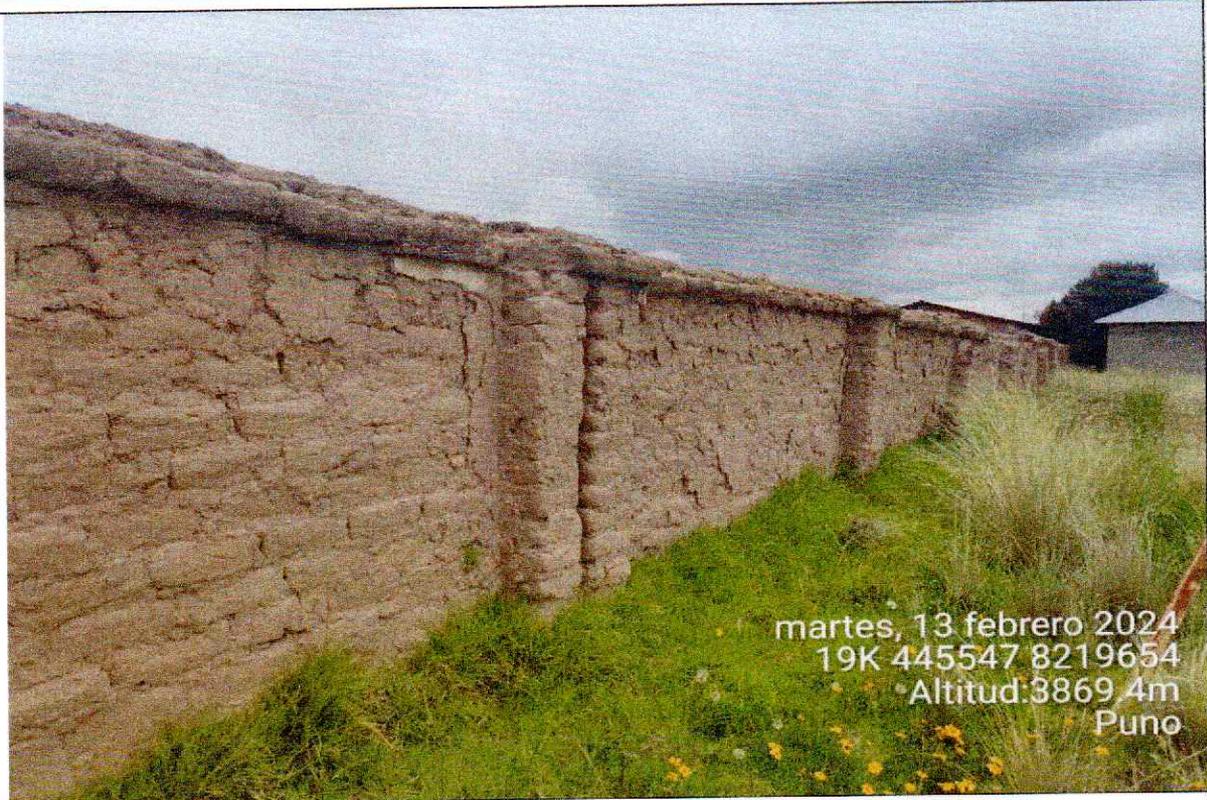

martes, 13 febrero 2024  
19K 445547 8219654  
Altitud: 3869.4m  
Puno

13 de Febrero del 2024

**MURO SUR A PUNTO DE COLAPSAR**



martes, 13 febrero 2024  
19K 445545 8219654  
Altitud: 3868.1m  
Puno

13 de Febrero del 2024

**MURO SUR DEL CERCO PERIMETRICO**
